


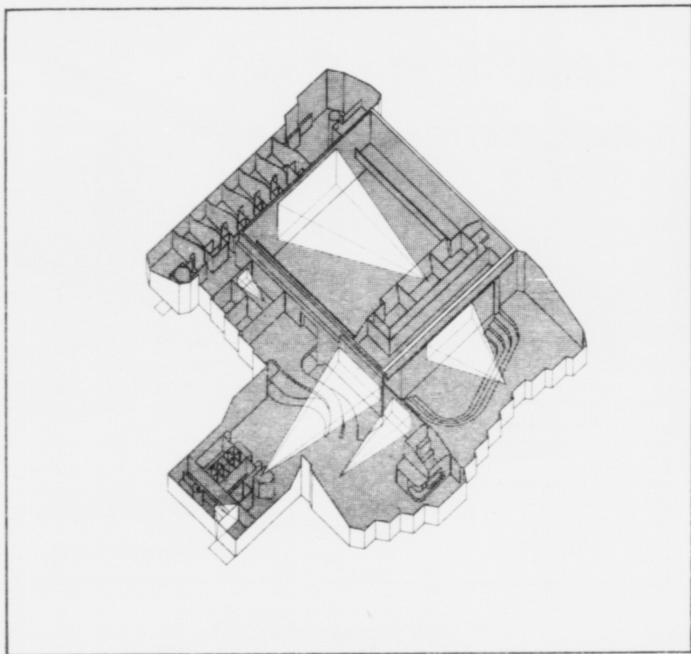

gingið væl, verður
upplýst, og at flest øll
byggifeløg hava fingið
pengar sínar.

Hvert ætlaða byggiupp-
hæddin heldur, verður ekki
greitt fyrr enn við árslok,
men metir stýrisbólkurinn,
at húsið ekki kostar meira
enn 67 mill. kr., móti
teimum 63 mill. kr., sum
mett var frammanundan.

Tó at ætlanin var at Norðurlandahúsið við mangulista og øðrum umvælingum vrentandi skuldi verða liðugt í oktober mánaða, so er enn ikki útlit til, at nakað størvegis hendur. Arkitekturin umber seg við, at glastilfar og annað byggitilfar, sum verður umbiðt í hinum Norðurlondum, ikki er komið ella at tilfarið er oyðilagt á ferðini, tí flutningsveginir til Føroya eru so truplir.

Almenningur ikki skil fyri tí

Tá var nýggjur stýrisbólkur settur, ið skal taka sær av virkseminum í stovnunum, sum skal virka komandi tvey árin.

Í stýrisbólkin kom Jan Stiernstad, formaður, D. Stiernstad, formaður, D.P. Danielsen, næst-Landsstýrinum Flemming

Samuelsen og Elisabeth Zachariassen, umframt eitt umboð fyri hvørt av hinum Norðurlöndunum.

Sosialurin spurdi tá Jan Sternstad, hvi so lítið varð komið út um endaligu handanina og liðugtgerð av stovninum.

Jan Stundrad segði m.a. — Grundarlagið fyrir at skilja hetta stórarbeiðið er ikki til staðar í almenn-
inginum, og tí hildu vit tað vera rættast, at so lítið sum gjørligt kom út.


Hevur ósemja verið millum stýrisbólk og arkitekt?

— Eg ásanni, at ávísar ósemjur í eitt tíðarskeið hava verið, men at hetta nú er fingið í rætt lag. Vit vóna at Norðurlandahúsið nú fær møguleika at virka út frá teimum ynskjum, sum vit settu okkum, tá tað varð bygt.

Arkitekturin vil verða
við, at hann ikki hevur
goymt nakrar tekningar,
men at tað í byggætlanini
var viðmerkt, at broyt-
ingar kundu gerast í bygg-
ingini so hvørt sum frá-
leið. Hann sigur seg ikki
hava gjørt nakað
oregulgligt?

— Tað er rætt, at arkitekturin fekk løyvi at broyta tekningarnar í samráð við stýrisbólkin, um tað var neyðugt fyri at fáa betri úrslit enn upprunaliga mett. Men hann skuldi eisini broyta tekningarnar, so hvørt sum hetta fór fram. Hetta arbeiðið er í ávisum førum ikki gjørt.

Tað hefur fært við sær,
at vit ikki rættuliga vita,
hvussu húsið er bygt, ella
hvar broytingar eru farnar
fram. — Vit mugu hava í
huga, at ein tekning er
sum ein uppskrift, har tú
kanst siggja, hvussu ar-
beiðið er farið fram og

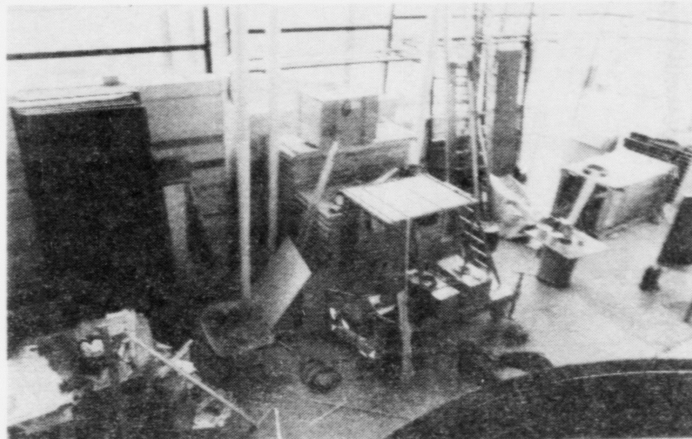

Hoast stýrisbólkurin fyri byggingina og Ola Steen, arkitektur hava játtað, at Norðurlandahúsið skuldi verða liðugt í oktober mánaða, so var ikki útlit fyri ti, tá Sosialurin fyri fjúrtan døgum síðani avmýndaði grafiska verkstaðin, har steinpresse skal hava innivist

hvussu nógv tað kostar. Tað kunnu vit ikki í øllum førum við Norðurlanda-húsinum.

Steen Cold, leiðari í Norðurlandahúsinum sigur í viðmerking til hetta skrifaða, at enn er nógv eftir, til stovnurin kann nýtast eftir tí, hann var ætlaður til.

— Vit hava gjørt nogvar royndir at samstarva við byggiharran. Fyri at geva teimum møguleika at rætta upp aftur skeivleikarnar, lótu vit stovnin aftur fyri almenninginum ein mánaða í summar. Tað hendi framvegis einki.

Nú hafa vit samtykt at lata aftur eitt tíðarskeið í desember mánaða, so möguleiki er at sleppa til, har tað er neyðugt við umvælingum.

Ringar arbeiðs- umstöður

— Eitt er at vita hava vánaligar arbeiðsumstøður, men hetta merkja fólk ikki, sum vitja. Annað er, at listafólk og bólkur, sum vit hava umbiðið til framfærslur og framsýningar, ikki í longdini kunnu hava töl at samstarva við okkum.

Torferu umstöðurnar hjá okkum kunnu lættliga føra við sær, at Norðurlandahúsið í framtíðini fær ringt orð á seg, so eingin vil koma n. n. d. vegin at arbeiða.

Higartil hava vit bert møtt vælvild frá listafólku, sum ferð eftir ferð hava fingið útsett sýningarnar, men ein dag er tolsemi teirra uppi, og tá kann tað nerva virksemd í Norðurlandahúsinum.

Nú er bert eftir at vóna, at trupulleikar okkara eru av innan árslok, sigur Steen Cold at enda.




Ola Steen: — Kenschuliga hevur tað verið eitt torført byggimál, men persónliga ein stuttleikauppgáva, at fáa loyvi at royna

Tit ringja

— vit skriva

Ringiõ telefon

11820



Flutningstrupulleikar hafa verið nevndir í byggimál-
inum, sum ein av orsökunum til, at liðugtgerðin er so
nógv seinkað. Steinpressan kom tó til tíðina, men hevur
staðið í hesum konteynararum í fleiri mánaðar. Har
stendur hon enn.
