


Bygningar hjá Landssjúkrahúsinum

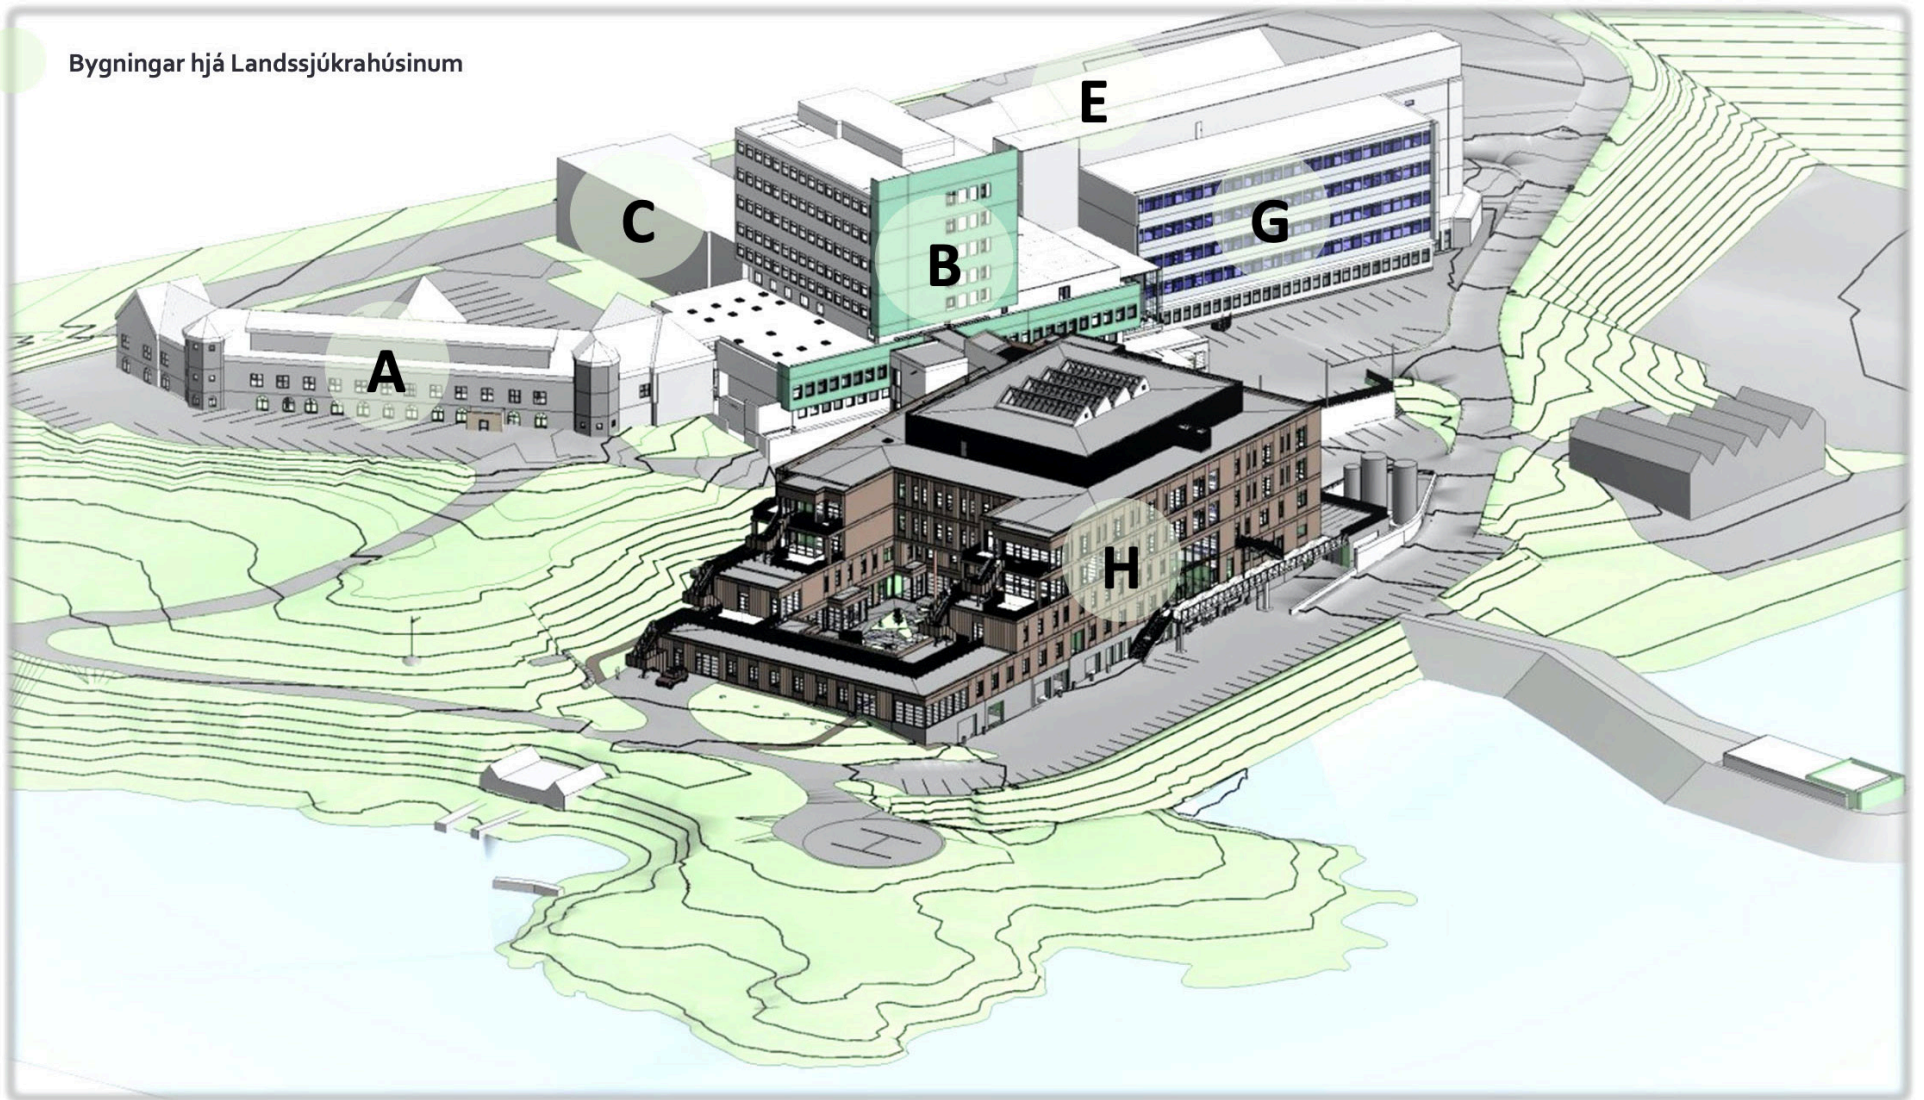

Byggigøla skal krógvast yvir fleiri fíggjarlógir

Størsta bygging á landi í Føroyum – Landssjúkrahúsið – er vorðin nógv dýrari enn ætlað

Árni Gregersen

arni@socialurin.fo

Almennir myndugleikin í Føroyum stendur við einum stórum spurningi at taka støðu til her fyrst í árinum.

Fyri at nýggi H-bygningurin skal kunna gerast liðugur og sambindast við verandi sjúkrahús skal játtanarmyndugleikin koma við í minsta lagi 150 milljónum krónum afturat, so verkætlanin tilsamans fer upp um 800 milljónir krónur.

Upprunaliga var ætlanin, at verkætlanin skuldi kosta 650 milljónir tilsamans.

Gamaní er talan um eina verkætlan, sum byrjar í 2008, men broytingar eru gjørdar í

2011, 2013 og 2017.

Lóginrarnar snúgva seg um at høvuðsumvæla, nútímansgera og útbyggja Landssjúkrahúsið.

Kaj Leo Holm Johannensen, landsstýrismaður, hevur lagt uppskot fyrri tingið um at játta 150 milljónir afturat, so verkætlanin kann gerast liðug eftir ætlanini.

Uppskotið kom í tingið um hálvan januar, men formaðurin í Løgtingsins fíggjarlóg, Magnus Rasmussen, segði kortanei at viðgera uppskotið í farna árinum, men vildi hava stundir at viðgera umbønina í nýggja árinum.

Formaðurin í fíggjarnevndini hevur sagt við Sosialin, at hetta er ein so stór eykajáttan, at hetta vil nevndin hava stundir at seta seg væl inn í.

Nógvar forkláringar

Við lógaruppskotinum, sum er lagt fyrri tingið, eru nógvar orsøkir nevndar til, hví H-bygningurin verður so dýrur.

Heilsuáráðið sigur, at staðfest er, at verandi verkætlanin við H-bygninginum gerst 101,2 mió. kr. dýrari enn upprunaliga ætlað. Greitt kann vera frá, at allur byggiroknskapurin er gjøgnumgingin og framroknað er, hvør samlaði kostnaðurin fyrri verkætlanina H-bygningurin fer at verða.

Viðari verður sagt:

Handverkaraútreiðslurnar verða dýrari enn mett í ætlanini, tí at mettu útreiðslurnar til handverkarar høvdu ov litlar og skeivar avsetingar í upprunaligu kostnaðarætlanini.

Í løgtingsmáli 47/2016 er ein feilur hendur, soleiðis at 13,4 mió. kr. til háisolatiónsstovur ikki vórðu taldar við í upphæddini. Hetta er nú tikið við. Eisini vóru sparringar fyrri 15 mió. kr. í ætlanini, og hevur tað ikki eydnast at koma á mál við teimum.

Eitt sum fellur í eyguni er, at ov lítið av pengum upprunaliga er settur av til proj-

ektering av fleiri pørtum av verkætlanini.

Til dømis sær tað út til at koma óvart á, at tilrigging og avrigging av sjálvum byggiplássinum ikki er við í upprunaligu kostnaðarmetningunum.

Heldur ikki tryggingar og íbindingargjöld eru tikin við í upprunaligu kostnaðarætlanina.

Millum annað tí er sjálvur H-bygningurin vorðin 100 milljónir dýrari. Afturat tí koma so eisini nýggj krøv frá brúkarunum.

Fermetraprísurin fyrri bygningin verður nú mettur at vera um 40.000 krónur.

Hetta inniheldur nýggi H-bygningurin

Nýggi bygningurin, nevndur H-bygningurin, skal hýsa nýggjum psykiatriskum depli, nýggjari medisinskari seingjadeild við einastovum, nýggjari føði- og barsilsdeild, nýggjari rehabiliteringseind og nýggjum køki.

Samlaða fermetratalið er 15.150.

Bygningurin kostar tilsamans 604,4 mió. kr. og verður fermetraprísurin slakar 40 tús. kr.

Bygningurin er samansettur av:

Hædd H-2: Tøknirúmi, vaskisentrali til sengur, goymslu, ruskrúmi og parkeringskjallara. Í alt umleið 3.700 m².

Hædd H-1: Køki og felags kantine umleið 1.650 m². Seingjadeild til psykiatriska depilin, sum er umleið 1.650 m² við 25 seingjaplássum. Harumframt garður 450 m².

Hædd H0: Rehabilitering umleið 1.400 m². Dagdeild til psykiatriska depilin umleið 1.100 m².

Hædd H1: Somatiskari seingjadeild við tveimum háisolatiónsstovum. Víddin er umleið 2.300 m² við 33 seingjaplássum, iroknað háisolatiónsstovur.

Hædd H2: Somatiskari seingjadeild. Har eru eisini føðistovur og neonatalstovur. Víddin er umleið 2.300 m², og pláss er fyrri 31 seingjastovum tilsamans. Hædd H3: Tøknirúmi til ventilatión umleið 800 m².
