

LEMJANDI KRITIKKUR MÓTI BYGGGINGINI Á LANDSSJÚKRAHÚSINUM

Ongin hevur skrivað undir nakra
kostnaðarætlan og frágreiðingarnar frá
byggifundunum eru eisini uttan undirskrivt


ÁRNI GREGERSEN

At byggja nýggja
H-bygningin á Lands-
sjúkrahúsinum sær
út til at vera blivin ein
marra fyri politisku skipanina.

Løgtingið hevur júst viðgjørt
frágreiðingina um byggingina í
sambandi við at landsrokn-
skapirnir skulu góðkennast og at upp-
skot ert er at játta meira pengar
til byggingina.

Men tað sum stendur um bygg-
ingna av Føroya størstu bygging á
landi, er marrulesnaður hjá ting-
fólki. Landsgrannskoðarin og
uttanhýsis grannskoðarin leggja
ikkí fingrarnar ímillum, mern vísa
á katastrofalar manglar í sjálvari
figgjarstýringini í sambandi við
byggingina.

Eitt er, at byggiverkætlanin
er voðrin munandi dýrari enn
upprunaliga ætlað. Tað verður
forklárað við millum annað, at

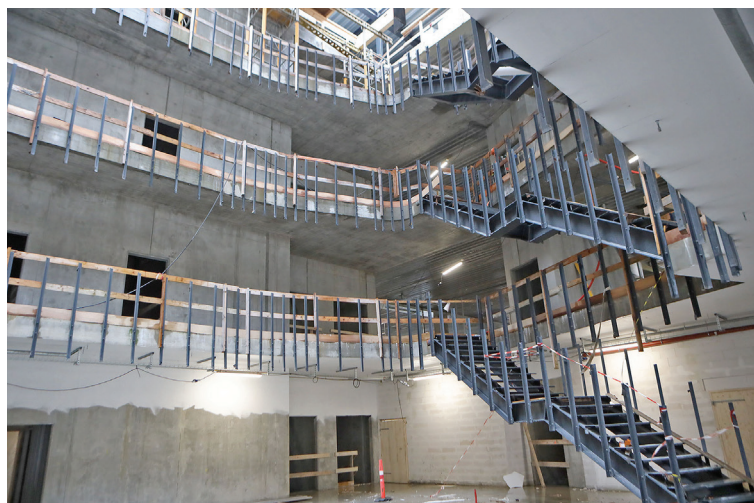

*H-bygningurin er nógv dýrari enn upprunaliga ætlað, men tað
sum verri er, er at onki skil hevur verið á figgjarstýringini.*

verkætlanin upprunaliga er frá
2008 og at tøkkin er vorðin betri
og eisini dýrari.

Í 2018 var farið undir at góðsku-
tryggja verkætlanirnar hjá Lands-
verki og tá vóru staðfestir týðandi

manglar í figgjarstýringini av
H-bygninginum, staðfestir leiðslan
sjálv í átekningunum til rokns-
skapin.

Hon sigur, at ábøtur eru gjørdar,
men framvegis manglar ein verk-

ætlanaravkláring og tað er ein
stórur mangul í grundarlagnum
fyri figgjarstýringini.

Ongin undirskrivt

At risastóra iløgan á Landssjúkra-
húsinum í fleiri ár er farin fram
uttan stýring, sæst millum annað
av, at figgjardeildin hjá Lands-
verki í februar og mars í fjør
gjørði eftirlitsarbeiði í samband
við byggingina av H-bygninginum.

Í niðurstøðuni frá 14.mai stend-
ur, at stórir manglar vóru í figg-
jarstýringini.

Millum annað var arbeitt eftir
einari kostnaðarætlan, sum als
ikkí er undirskrivað – og at hon
heldur ikki var fylgd.

Uttanhýsisgrannskoðarin stað-
festir, at teimum upplýst, so er
framvegis ongin kostnaðarætlan
gjørd.

Grannskoðarin er samdur við
figgjardeildini í, at ein nýggj neyv
kostnaðarætlan eigur at verða
gjørd við støði í gjørdum kostnað-
armetingini.

Grannskoðarin mælir til, at
innanhýsis eftirlitini hjá figgjar-
deildini verða gjørd mánaðarlaga.

Hvat er hvat

Talan er um ymisk viðurskifti, sum
gera, at tað er ómetaliga torført

hjá játtandi myndugleikanum at
vita, hvat pengarnir verða brúktir
til, tí sjálv verkætlanin fevnir um
bæði nýbygging og viðlíkahald av
gamla partinum av Landssjúkra-
húsinum.

Grannskoðarin viðmerkir, at
hann á ongan hátt hevur gjørt
nakra meting av, hvørt fyriliggj-
andi metingar av meirnýtisluni eru
nøktandi.

Metingin byggir ikki á eina
neyva dagfórda kostnaðarætlan.
Landsverk hevur í høvuðsheitum
gjørt fyriliggjandi meting í apríl/
mai í 2019, og sambært Lands-
verki eru fleiri viðurskifti umrødd
síðani hetta, sum skulu takast upp
fyri at meta um, hvørt fyriliggj-
andi meting er nøktandi.

Ein óvissa í uppgerðini, sum
bygginevndin hevur umrøtt, er
parturin av játtanini til innbúgv,
útgerð og tól upp á 58,1 milljónir
krónur, har ein stórur partur av
innkeypnum ikki er boðin út enn.
Metingin fevnir ikki um ynsk-
ir og krøv, ið ikki eru partur av
verklagslógini.

Tað gongur heldur ikki so skjótt,
sum ætlað at gera bygningin lidn-
an, tí biðið verður eisini um, at
verkætlanmarlógini verður longd
við einum ári afturat.

Betri fyrireikingar tá ið tað almenna skal byggja

Landsstýrismaðurin við heilsumálum er ikki
nøgdur við gongdina, tá ið tað almenna byggir

ÁRNI GREGERSEN

Siðani í september í fjør
er tað Kaj Leo Holm Jo-
hannesen, landsstýris-
maður við heilsumálum,
sum hevur evstu ábyrgdina í
heilsumálum og tí sum hartil
hoyrir.

Tað er eisini hann, sum hevur
biðið um meira pening til at gera
útbyggingina á Landssjúkrahús-
inum lidna.

- Ja, tí eg gjørði tað so skjótt
eg kom í heilsumálaráðið, at eg
sendi boð eftir Landsverk og setti
spurningar fyri at vita, hvussu

veruliga støðan er við útbygg-
ingini, sigur landsstýrismaðurin.

Hann hevur sjálvandi eisini lisið
grannskoðarafrágreiðingarnar og
sæð viðmerkingarnar.

- Hatta er sjálvandi ikki nøkt-
andi, men hatta hava við sær í fleiri
øðrum byggimálum. Manglandi
fyrireikingar og greiðar linjur fyri,
hvør hevur ábyrgdina av teimum
broytingum, sum verða gjørdar
ávegis, er nakað, sum vit mugu
fáa skil á, sigur Kaj Leo Holm
Johannesen.

Í hesum konkræta førinum er
tað soleiðis, at tað er heilsumála-
ráðið sum vil hava ein bygning,

sum Landsverk, so skal standa
fyri, men Landsverk hoyrir ikki
undir heilsumálaráðið, men undir
samferðslaráðið.

-Tað ger, at vit hava tvey ráð,
sum kunnu skylda hvørt uppá
annað, sigur hann.

Hann heldur, at neyðugt er, at
vit fara inn í mannagongdirnar og
tryggja, at hetta ikki hendir aftur.

Formaðurin í figgjarnevndini,
Magnus Rasmussen, hevur eisini
sagt, at figgjarnevndin av álvara
fer at kann málið og tryggja at
slikt ikki hendir aftur.



*Kaj Leo Holm Johannesen, landsstýrismaður við heilsumálum, sendi
boð eftir Landsverk og setti spurningar fyri at fáa skil á hvat hendir.*
